

本学キャンパスマップと建設予定地

撮影日:令和8年2月26日現在

◎撮影アングルごとの工事進捗状況は、写真又はマップ内の【➡】をクリックするとご覧いただけます。

【A】 工事現場事務所からの視点



工事の状況:引渡直前(撮影日:R8.2.26)

【B】 講義棟からの視点



工事の状況:引渡直前(撮影日:R8.2.26)



【D】グラウンド東側からの視点



工事の状況:引渡直前(撮影日:R8.2.26)


【C】グラウンド南側からの視点




工事の状況:引渡直前(撮影日:R8.2.26)

注:図中の「建設予定地」の位置及び敷地範囲は、厳密ではありませんのでご了承ください。


【A】 工事現場事務所からの視点




①工事の状況:重機による杭基礎工事(撮影日:R6.6.1)



②工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)



③工事の状況:山留工事(撮影日:R6.12.4)



④工事の状況:1階スラブ配筋工事(撮影日:R7.1.29)



⑤工事の状況:2階梁・柱配筋,3階壁配筋工事(撮影日:R7.3.7)



⑥工事の状況:4階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.4.14)

次ページに続く

【A】 工事現場事務所からの視点



⑦工事の状況:5階型枠建込工事(撮影日:R7.5.7)



⑧工事の状況:6階型枠建込工事(撮影日:R7.6.2)



⑨工事の状況:7階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.6.26)



⑩工事の状況:9階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.8.7)




⑪工事の状況:10階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.9.11)



⑫工事の状況:R階型枠建込工事(撮影日:R7.10.2)

次ページに続く

【A】 工事現場事務所からの視点

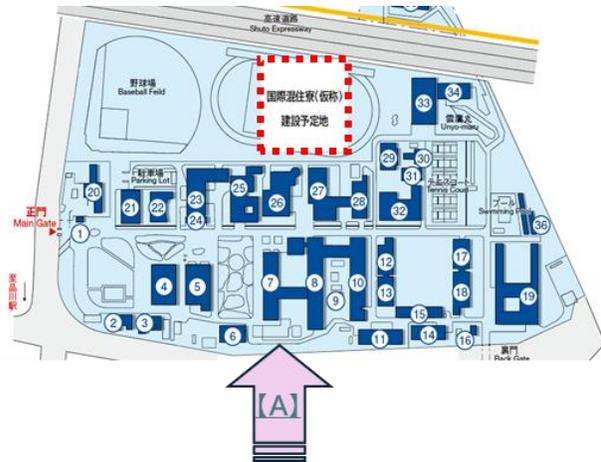

⑬工事の状況:引渡直前(撮影日:R8.2.26)

【B】講義棟からの視点



①工事の状況:準備工事/ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い(撮影日:R6.4.8)



②工事の状況:重機による整地作業(撮影日:R6.5.14)



③工事の状況:重機による杭基礎工事(撮影日:R6.6.1)



④工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)



⑤工事の状況:基礎コンクリート・配筋工事(撮影日:R6.12.4)



⑥工事の状況:2階壁配筋工事(撮影日:R7.2.20)

次ページに続く

【B】講義棟からの視点



⑦工事の状況:2階梁・柱配筋,3階壁配筋工事(撮影日:R7.3.7)



⑧工事の状況:4階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.4.14)




⑨工事の状況:5階型枠建込工事(撮影日:R7.5.7)



⑩工事の状況:6階型枠建込工事(撮影日:R7.6.2)



⑪工事の状況:7階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.6.26)



⑫工事の状況:9階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.8.7)

次ページに続く

【B】講義棟からの視点



⑬工事の状況:10階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.9.11)



⑭工事の状況:R階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.10.2)



⑮工事の状況:引渡直前(撮影日:R8.2.26)



[トップページに戻る](#)


【C】グラウンド南側からの視点



①工事の状況:準備工事/ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い(撮影日:R6.4.8)



②工事の状況:重機による整地作業(撮影日:R6.5.14)



③工事の状況:重機による杭基礎工事(撮影日:R6.6.1)



④工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)



⑤工事の状況:基礎コンクリート・配筋工事(撮影日:R6.12.4)



⑥工事の状況:1階スラブ配筋工事(撮影日:R7.1.29)

次ページに続く

【C】グラウンド南側からの視点



⑦工事の状況:2階梁・柱配筋,3階壁配筋工事(撮影日:R7.3.7)



⑧工事の状況:4階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.4.14)



⑨工事の状況:5階型枠建込工事(撮影日:R7.5.7)



⑩工事の状況:6階型枠建込工事(撮影日:R7.6.2)



⑪工事の状況:7階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.6.26)



⑫工事の状況:9階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.8.7)

次ページに続く

【C】グラウンド南側からの視点



⑬工事の状況:10階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.9.11)



⑭工事の状況:R階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.10.2)



⑮工事の状況:引渡直前(撮影日:R8.2.26)



[トップページに戻る](#)

【D】グラウンド東側からの視点



①工事の状況:準備工事/ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い(撮影日:R6.4.8)



②工事の状況:重機による整地作業(撮影日:R6.5.14)




③工事の状況:重機による杭基礎工事(撮影日:R6.6.1)



④工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)




⑤工事の状況:基礎コンクリート・配筋工事(撮影日:R6.12.4)




⑥工事の状況:1階スラブ配筋工事(撮影日:R7.1.29)

次ページに続く


【D】グラウンド東側からの視点




⑦工事の状況:2階梁・柱配筋,3階壁配筋工事(撮影日:R7.3.7)




⑧工事の状況:4階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.4.14)



⑨工事の状況:5階型枠建込工事(撮影日:R7.5.7)



⑩工事の状況:6階型枠建込工事(撮影日:R7.6.2)




⑪工事の状況:7階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.6.26)




⑫工事の状況:9階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.8.7)

次ページに続く


【D】グラウンド東側からの視点




⑬工事の状況:10階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.9.11)



⑭工事の状況:R階梁・柱配筋工事(撮影日:R7.10.2)

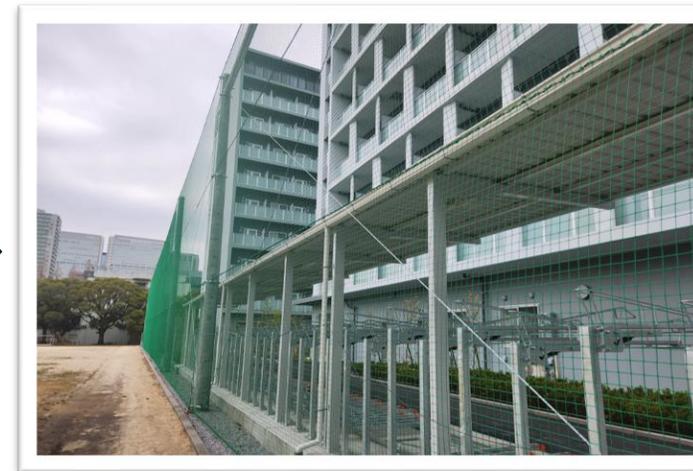

⑮工事の状況:引渡直前(撮影日:R8.2.26)

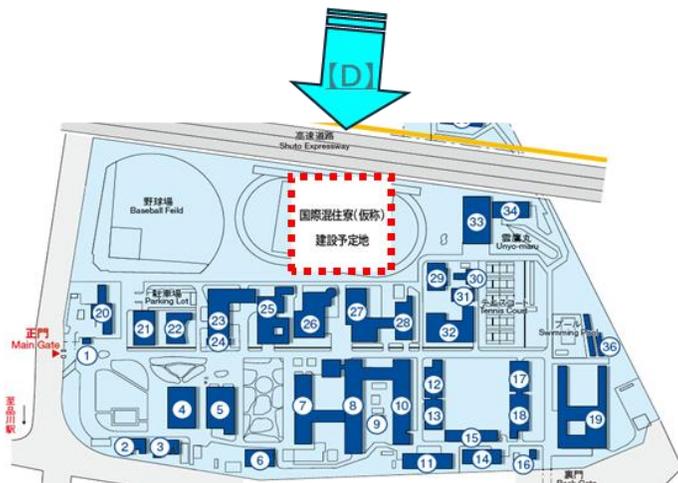

[トップページに戻る](#)
